BŪVDARBU ORGANIZĀCIJAS SHĒMA

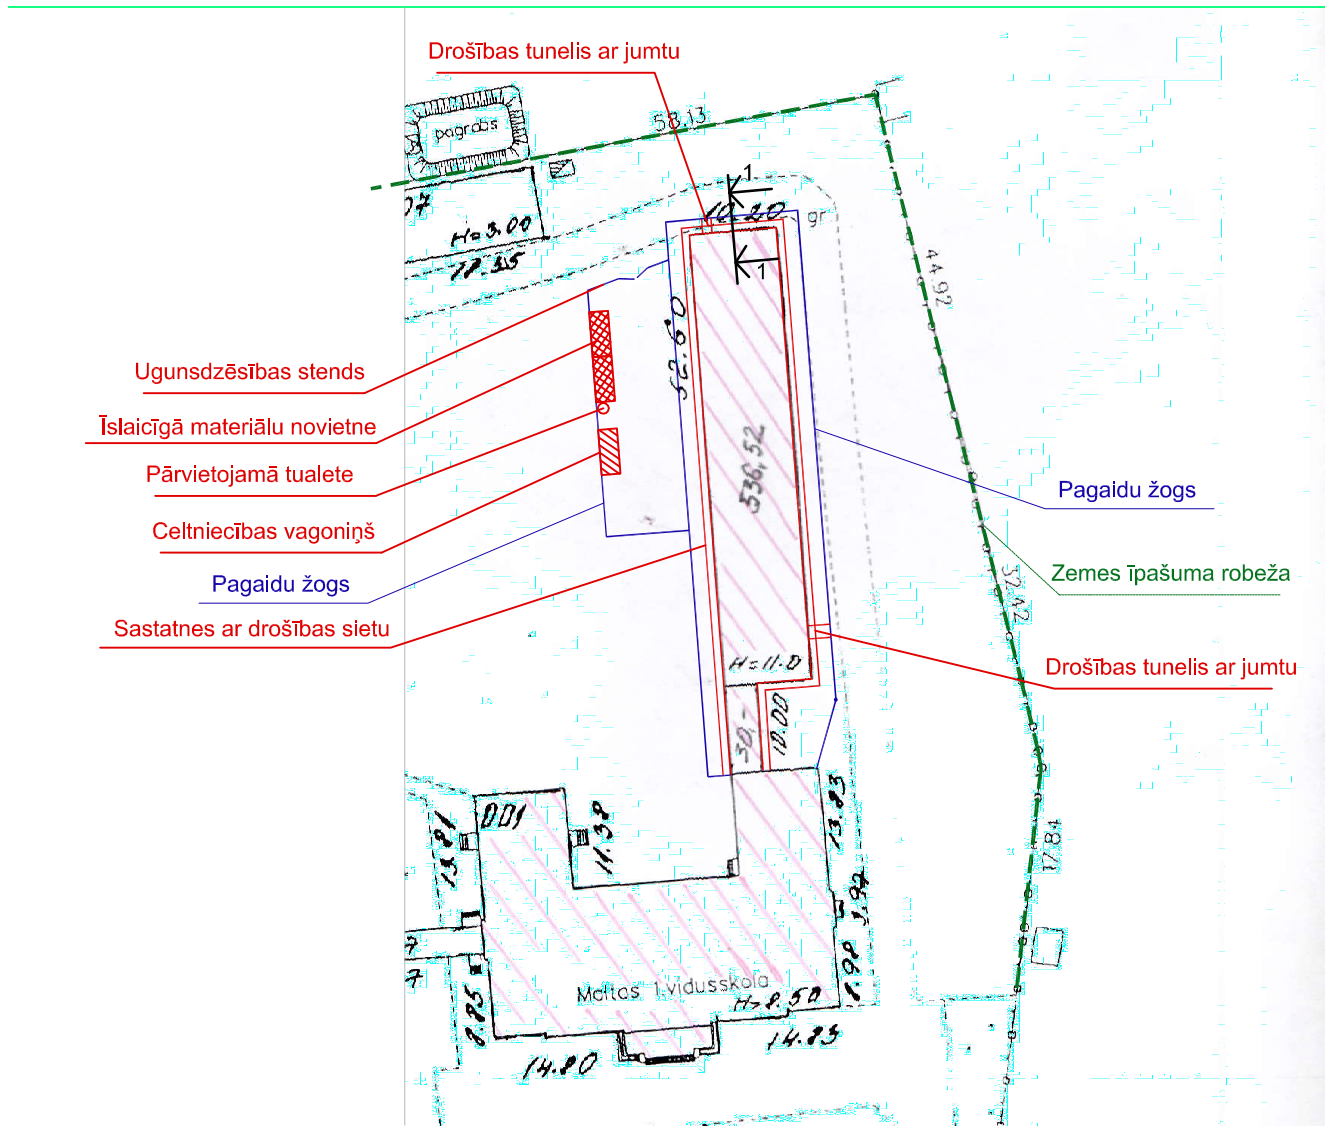

1-1

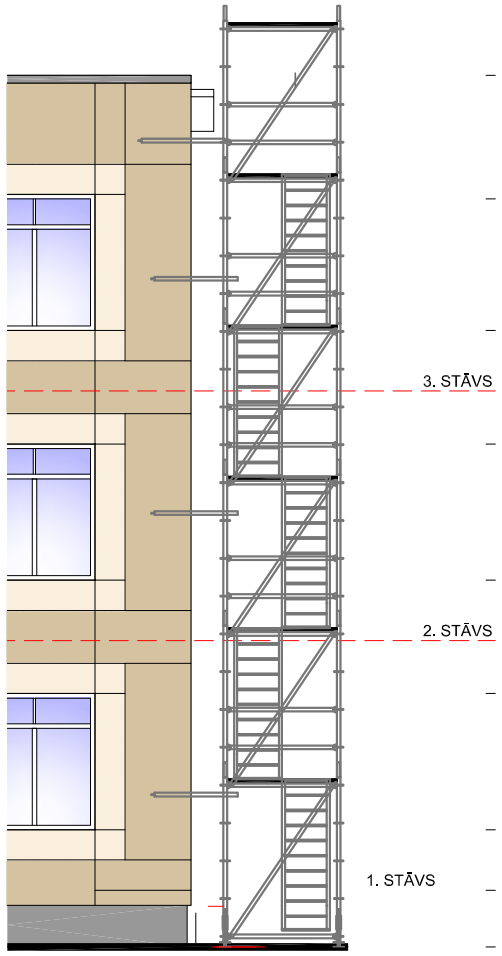

1

DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS STRĀDĀJOT AUGSTUMĀ AR CELTNIECĪBAS SASTATNĒM

1. Darba devējs norīko darba aizsardzības speciālistu;
2. Sastatnes, pirms izmantošanas, jāapskata darbu vadītājam;
3. Sastatnes montēt, demontēt vai pārvietot var tikai atbildīgā speciālista uzraudzībā;
4. Sastatnes stiprināt pie fasādes;
5. Pārbaudīt darbu veikšanas vietas apgaismojumu. Par pietiekamu uzskatāms apgaismojums, kura stiprums ir vismaz 50lx;
6. Veicot darbu no sastatnēm augstāk par 3m, jālieto drošības josta un drošības virve, kuru stiprina pie būves konstrukcijas vai pie sastatnēm, ja tās droši nostiprinātas pie konstrukcijas;
7. Krišanas gadījumā pievilkties pa drošības virvi uz drošu vietu un nepieciešamības gadījumā signalizēt (ar balsi) par to, ka nepieciešama palīdzība.
8. Ja noticis nelaimes gadījums, jāsniedz palīdzība cietušajam, jāziņo par notikušo tiešajam darbu vadītājam un jāsaglabā nelaimes gadījuma apstākļi, ja tas nerada briesmas apkārtējiem.

PRASĪBAS SASTATNĒM

1. Sastatņu darba klājumam jābūt norobežotam ar sānu aizsargnožogojumu, kas sastāv no kāju līstes, vidējā balsta (0,5m augstumā virs darba klāja) un rokas balsta 1,0m augstumā virs darba klāja. Atbilstoši darba specifikai vidējais balsts vai kāju līste var nebūt.
2. Sastatnes jāuzstāda uz līdzenas slodzi nestspējīgas virsmas. Gadījumā, ja virsma nav pietiekoši stingra, pielieto palikņus. Palikņi slodzes iedarbībā nedrīkst sadrupt, izjukt vai nobīdīties. Augstuma starpību izlīdzināšanai pielieto regulējamās kājas ar liela diametra pēdu.
3. Sastatnes jānostiprina pie stingras konstrukcijas atbilstoši tās lietošanas pamācībā uzrādītajam. Aizliegts sastatņu stiprināšanu izdarīt ar stieples palīdzību, par konstruktīvo elementu izmantojot lietus notekcaurules vai citus līdzīgus elementus.
4. Aizliegta patvaļīga sastatņu pārvietošana, papildaprīkojuma uzstādīšana vai noņemšana, kā arī citu nesankcionētu korekciju veikšana.

PIEZĪMES

- Objektā ar pavēli ir jābūt noformētam atbildīgajam speciālistam par darba drošības noteikumu stingru ievērošanu veicot būvdarbus;
- Pirms zemes darbu veikšanas, veikt komunikāciju šurfēšanu;
- Būvniecības laikā veikt būvlaukumā ugunsdrošības pasākumus atbilstoši normatīvajām prasībām;
- Visu konstrukciju un kravu celšanu veikt tikai būvlaukuma robežās;
- Ierīkot kravu laukumus saskaņā ar būvģenplānu;
- Uzstādīt metināšanas punktu. Metinot un strādājot ar atklātu uguni, darba vietā jābūt ugunsdzēšamajam aparātam
- Strādniekiem, atrodoties būvlaukumā, jālieto individuālās aizsardzības līdzekļi (ķiveres, austiņas, aizsargbrilles)
- Strādāt augstumā atļauts tikai ar drošības jostām, kuras nostiprina pie konstrukcijas mezgliem;

ARCHE Pils iela 13-4 · Sigulda, LV-2150 · Latvija · Tālr.: 29642028 · e-mail: arche@apollo.lv · Reģ.nr.40003840089	Projekta Nr.: 049		Objekta nosaukums: Izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana	
Uzņēmuma vadītājs	Jānis Bērziņš		Pasūtītājs: Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde	
Arhitekts	Aivars Robiņš		Adrese: Skolas iela 5, Malta, Maltas pag., Rēzeknes novads	
			Kadastra Nr.: 7870 003 0589 001	Projekta izstrādes datums: 07.2014.
Rasējuma nosaukums: Būvdarbu organizācijas shēma			Mērogs:	Lapa: DOP-2 / Lapas kopā: 2 / DOP
			Projekta stadija: VR	Caurejošais lapas Nr.:
